AUFMASS VOM KUNDEN · FÜRS ANGEBOT

Familie Weber

Lindenstraße 14, 50823 Köln · Einfamilienhaus, Baujahr 1978

4 Positionen | **5 Elemente** | **8 Fotos ausgewertet** | **alle Maße vollständig** | **alle Maße in mm**

IHR KUNDE

Kontakt	0171 234 56 78
Objekt	Lindenstraße 14, 50823 Köln

ECKDATEN ZUM PROJEKT

Gebäude	Einfamilienhaus, Baujahr 1978
Fenster im Haus	5 von 11 · Lüftungskonzept erforderlich (DIN 1946-6)
Zeitraum	in 1 bis 3 Monaten
Budget	10.000 bis 20.000 € · Förderung: noch offen
Zu klären	**Lüftungskonzept, Förderweg · Einzelheiten nach Pos. 1**
Nachricht	„Der Rollladen im Bad klemmt, bitte mit anschauen.“


1 Wohnzimmer

Fenster · Dreh-Kipp DIN links · Fest · EG · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMASS-VORSCHLAG

1.759 × 1.394 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, minus 15 mm oben

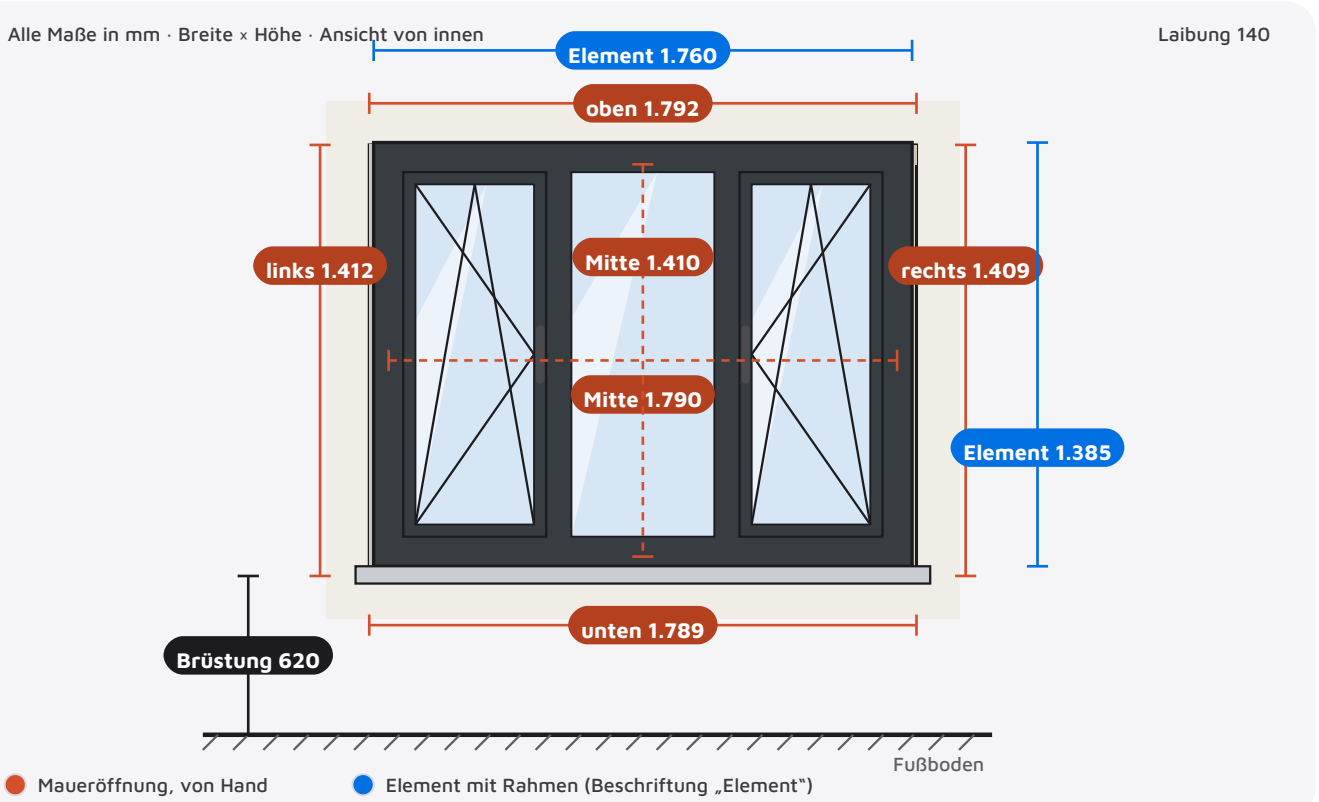

FENSTERBAU BRANDT · Aufmaß Ihres Kunden · erstellt mit eeziframes · eeziframes.com

MASSE

Maueröffnung	**1.789 × 1.409 mm**
Breiten	oben 1.792 · Mitte 1.790 · unten 1.789
Höhen	links 1.412 · Mitte 1.410 · rechts 1.409
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	**1.760 × 1.385 mm, mit Rahmen**
Brüstung	620 mm
Laibung innen	140 mm
Bestellmaß	**1.759 × 1.394 mm**

AUSFÜHRUNG

Element	Fenster
Teilung	3 Flügel, Mitte fest
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Fest · Dreh-Kipp DIN rechts
Form	Rechteck
Material	Kunststoff
Farbe außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Farbe innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	3-fach
Sprossen	keine
Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

EXTRAS

Sonnenschutz außen	Rollladen, Aufsatzkasten, silber, elektrisch
Sonnenschutz innen	keiner
Insektenschutz	Spannrahmen
Fensterbank innen	Naturstein
Fensterbank außen	Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen


EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Rollladen	Einbaukasten innen über der Öffnung mit Revisionsdeckel, Gurt mit Unterputz-Wickler links
Anschlag	Innenanschlag, Blendrahmen sitzt etwa 2 cm hinter der Innenkante
Fensterbank innen	Naturstein, etwa 25 cm tief, über dem Heizkörper
Heizung	Heizkörper direkt unter dem Fenster
Fassade	Putz auf Mauerwerk, Außenanschlag etwa 3 cm
Zugang	Erdgeschoss, kein Gerüst nötig
Hinweis 1	**Der Gurtwickler sitzt in der Laibung; nach dem Ausbau ist Putz nachzuarbeiten.**
Vor Ort prüfen	Dämmung und Luftdichtheit des Rollladenkastens prüfen.


MIT DEM KUNDEN ZU KLÄREN

Lüftung	**Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erforderlich: 5 von 11 Fenstern werden getauscht, mehr als ein Drittel.**
Förderung	Noch offen: BAFA-Zuschuss oder Steuerbonus, vor dem Auftrag klären.


ALLE ELEMENTE IM SELBEN MASSSTAB




1 · Wohnzimmer
1.760 × 1.385



2 · Küche
1.230 × 1.410



3 · Bad
880 × 1.010



4 · Schlafzimmer
1.230 × 1.410 · 2 Stk.

FENSTERBAU BRANDT · Aufmaß Ihres Kunden · erstellt mit eeziframes · eeziframes.com


2 Küche

Fenster · Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts · EG

BESTELLMASS-VORSCHLAG
1.229 × 1.424 mm
Öffnung minus 15 mm je Seite, minus 15 mm oben

Alle Maße in mm · Breite × Höhe · Ansicht von innen

Laibung 120

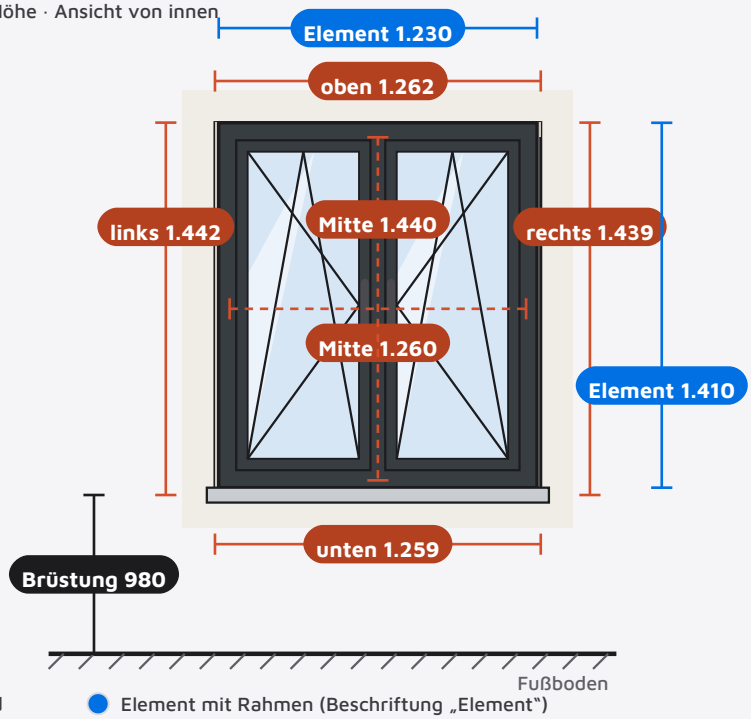

Maueröffnung, von Hand · Element mit Rahmen (Beschriftung „Element")

MASSE

Maueröffnung	**1.259 × 1.439 mm**
Breiten	oben 1.262 · Mitte 1.260 · unten 1.259
Höhen	links 1.442 · Mitte 1.440 · rechts 1.439
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	**1.230 × 1.410 mm, mit Rahmen**
Brüstung	980 mm
Laibung innen	120 mm
Bestellmaß	**1.229 × 1.424 mm**

AUSFÜHRUNG

Element	Fenster
Teilung	2 Flügel, mit Pfosten
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts
Form	Rechteck
Material	Kunststoff
Farbe außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Farbe innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	3-fach, Sicherheitsglas
Sprossen	keine
Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

EXTRAS

Sonnenschutz außen	keiner
Sonnenschutz innen	keiner
Insektenschutz	keiner
Fensterbank innen	Werzalit
Fensterbank außen	Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Laibung	Fliesenspiegel bis an den Blendrahmen
Fensterbank innen	Kunststoff, weiß
Hindernisse	Arbeitsplatte mit Spüle unter dem Fenster, der Flügel muss darüber aufgehen
Elektro	Steckdose in der Brüstung neben der Spüle
Hinweis 1	**Für den Ausbau die Arbeitsplatte freiräumen; Fliesen am Rahmen können beschädigt werden.**

FENSTERBAU BRANDT · Aufmaß Ihres Kunden · erstellt mit eeziframes · eeziframes.com


3 Bad

Fenster · Dreh-Kipp DIN links · OG · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMASS-VORSCHLAG
874 × 1.024 mm
Öffnung minus 15 mm je Seite, minus 15 mm oben

Alle Maße in mm · Breite × Höhe · Ansicht von innen

Laibung 120

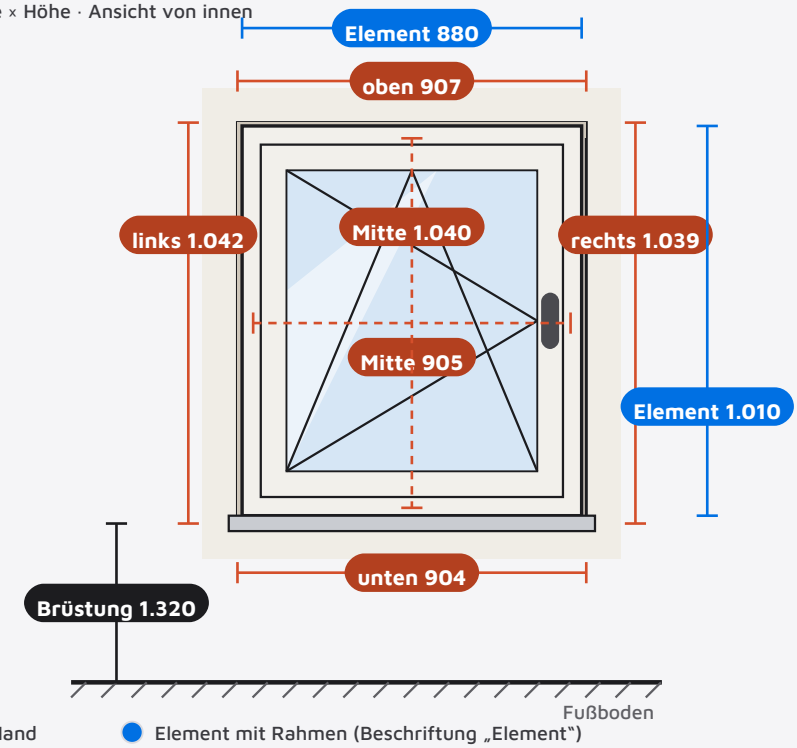

Maueröffnung, von Hand · Element mit Rahmen (Beschriftung „Element")

MASSE

Maueröffnung	**904 × 1.039 mm**
Breiten	oben 907 · Mitte 905 · unten 904
Höhen	links 1.042 · Mitte 1.040 · rechts 1.039
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	**880 × 1.010 mm, mit Rahmen**
Brüstung	1.320 mm
Laibung innen	120 mm
Bestellmaß	**874 × 1.024 mm**

AUSFÜHRUNG

Element	Fenster
Teilung	1 Flügel
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links
Form	Rechteck
Material	Kunststoff
Farbe außen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
Farbe innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	3-fach, Sichtschutz (Satinato)
Sprossen	keine
Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

EXTRAS

Sonnenschutz außen	keiner
Sonnenschutz innen	keiner
Insektenschutz	keiner
Fensterbank innen	Werzalit
Fensterbank außen	Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Laibung	Gefliest, Fliesen laufen bis an den Blendrahmen
Rollladen	Kein Kasten, kein Sonnenschutz
Feuchte	Feuchteflecken in der unteren Laibungsecke
Besonderheit	Bad: Sichtschutz und Lüftung beim neuen Fenster mitdenken
Hinweis 1	**Die Fliesen an der Laibung werden beim Ausbau wahrscheinlich beschädigt.**
Vor Ort prüfen	Ursache der Feuchte in der Laibungsecke klären.

FENSTERBAU BRANDT · Aufmaß Ihres Kunden · erstellt mit eezieframes · eezieframes.com

4 Schlafzimmer

Fenster · Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts · OG


BESTELLMASS-VORSCHLAG

1.229 × 1.424 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, minus 15 mm oben

Alle Maße in mm · Breite × Höhe · Ansicht von innen

Laibung 140

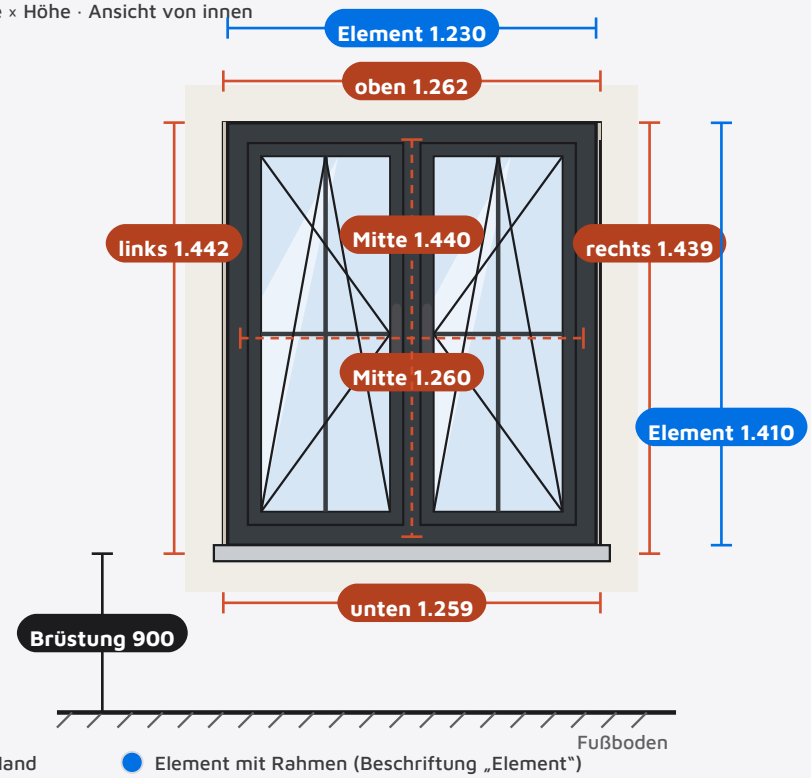

Maueröffnung, von Hand · Element mit Rahmen (Beschriftung „Element")

MASSE

Maueröffnung	**1.259 × 1.439 mm**
Breiten	oben 1.262 · Mitte 1.260 · unten 1.259
Höhen	links 1.442 · Mitte 1.440 · rechts 1.439
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	**1.230 × 1.410 mm, mit Rahmen**
Brüstung	900 mm
Laibung innen	140 mm
Bestellmaß	**1.229 × 1.424 mm**

AUSFÜHRUNG

Element	Fenster
Teilung	2 Flügel, mit Pfosten
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts
Form	Rechteck
Material	Kunststoff
Farbe außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Farbe innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	3-fach
Sprossen	Wiener Sprosse, 26 mm, 4 Stück
Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

EXTRAS

Sonnenschutz außen	bestehender bleibt
Sonnenschutz innen	keiner
Insektenschutz	keiner
Fensterbank innen	behalten
Fensterbank außen	Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Rollladen	Einbaukasten innen, Gurt mit Aufputz-Wickler
Fassade	Putz, Außenanschlag erkennbar
Zugang	Obergeschoss, Montage von innen möglich
Vor Ort prüfen	Rollladenkasten auf Dämmung prüfen.

FENSTERBAU BRANDT · Aufmaß Ihres Kunden · erstellt mit eeziframes · eeziframes.com

Übersicht

4 Positionen · 5 Elemente · Bestellmaß = Öffnung minus Abzug

POS.	FENSTER	ÖFFNUNG	ELEMENT	BESTELLMASS	ÖFFNUNGSART	FARBE AUSSEN	STK.
1	**Wohnzimmer** EG · Brüstung 620 · 2 Fotos	1.789 × 1.409	1.760 × 1.385	1.759 × 1.394	Dreh-Kipp DIN links · Fest · Dreh-Kipp DIN rechts	Anthrazitgrau	1
2	**Küche** EG · Brüstung 980 · 2 Fotos	1.259 × 1.439	1.230 × 1.410	1.229 × 1.424	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts	Anthrazitgrau	1
3	**Bad** OG · Brüstung 1.320 · 2 Fotos	904 × 1.039	880 × 1.010	874 × 1.024	Dreh-Kipp DIN links	Verkehrsweiß	1
4	**Schlafzimmer** OG · Brüstung 900 · 2 Fotos	1.259 × 1.439	1.230 × 1.410	1.229 × 1.424	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts	Anthrazitgrau	2

Maueröffnung: von drei Breiten und drei Höhen zählt das kleinste Maß; Abweichungen stehen bei der Position. Element: das sichtbare Fenster mit Rahmen. Öffnungssymbole: Linien beginnen an der Bandseite, die Spitze zeigt zum Griff; Dreieck mit Spitze oben = Kipp. Bestellmaß: Vorschlag aus Ihrem Abzug, verbindlich bleibt Ihr Feinaufmaß.

AUSSTATTUNG IM ÜBERBLICK

Material	Kunststoff
Farbe außen	unterschiedlich, siehe Positionen
Farbe innen	Verkehrsweiß
Glas	unterschiedlich, siehe Positionen
Sprossen	unterschiedlich, siehe Positionen
Sonnenschutz außen	unterschiedlich, siehe Positionen
Sonnenschutz innen	keiner
Insektenschutz	unterschiedlich, siehe Positionen
Fensterbank	unterschiedlich, siehe Positionen
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

ZAHLEN

Positionen	4
Elemente	5
Fensterfläche	etwa 8,5 m² (Element, alle Stück)
Größtes Element	Wohnzimmer, 1.760 × 1.385 mm
Geschosse	EG, OG
Fotos	8, von der KI ausgewertet
Maße	**alle 8 Handmaße je Fenster**
Ihr Abzug	15 mm je Seite, 15 mm oben

FENSTERBAU BRANDT · Aufmaß Ihres Kunden · erstellt mit eeziframes · eeziframes.com
