AUFMAß VOM KUNDEN · FÜRS ANGEBOT

Familie Mustermann.

Musterweg 12, 50667 Köln · Einfamilienhaus, Baujahr 1978

13 Fenster und Türen

4 Geschosse

9 mit Sonnenschutz außen

15 zu klären, davon 4 Pflicht

MAßE VOM KUNDEN **13 von 13 vollständig**

8 Maße je Fenster · Feinaufmaß folgt · 20 Fotos ausgewertet

IHR KUNDE

Kunde	Familie Mustermann
Kontakt	0221 555 01 23 · familie.mustermann@beispiel.de
Erreichbar	nachmittags
Objekt	Musterweg 12, 50667 Köln

ECKDATEN ZUM PROJEKT

Gebäude	Einfamilienhaus, Baujahr 1978
Fenster im Haus	13 von 16 werden getauscht
Zeitraum	in 1 bis 3 Monaten
Budget	über 20.000 €
Förderung	BAFA-Zuschuss (BEG EM)

13 POSITIONEN · 13 ELEMENTE · NACH GESCHOSS · MIT BESTELLMAß

Übersicht.

Maße in mm · Breite × Höhe

Zeichen: RL Rollladen · RS Raffstore · SC Screen · KL Klappläden · IS Insektenschutz · IN innen · vor Ort prüfen

CODE	POSITION	ÖFFNUNG	ELEMENT	BESTELLMAß	AUSSTATTUNG	SEITE
Keller					1 Position · 1 Element	
KG-01	**Hobbyraum** Fenster · 1 Flügel	810 × 610	785 × 585	**780 × 565**	IS	5
Erdgeschoss					6 Positionen · 6 Elemente	
EG-01	**Wohnen links** Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld	2.010 × 1.410	1.980 × 1.385	**1.980 × 1.365** !	RS IS	6
EG-02	**Wohnen Terrasse** Hebe-Schiebe-Tür	3.020 × 2.260	2.990 × 2.240	**2.990 × 2.245**	RS IS	7
EG-03	**Küche** Fenster · 2 Flügel	1.260 × 1.210	1.230 × 1.185	**1.230 × 1.165**	RL IS	8
EG-04	**Essen** Balkontür · 1 Flügel	910 × 2.190	885 × 2.170	**880 × 2.175** !	RL IS	9
EG-05	**Gäste-WC** Fenster · 1 Flügel	615 × 815	590 × 790	**585 × 770**		10
EG-06	**Flur neben der Haustür** Festverglasung	420 × 2.120	400 × 2.100	**390 × 2.075**		11
1. Obergeschoss					4 Positionen · 4 Elemente	
OG-01	**Schlafen** Fenster · 2 Flügel	1.510 × 1.260	1.480 × 1.235	**1.480 × 1.215**	RL IN IS	12

Zeichen: RL Rollladen · RS Raffstore · SC Screen · KL Klappläden · IS Insektenschutz · IN innen · vor Ort prüfen

CODE	POSITION	ÖFFNUNG	ELEMENT	BESTELLMAß	AUSSTATTUNG	SEITE
1. Obergeschoss, Fortsetzung					4 Positionen · 4 Elemente	
OG-02	 **Kind 1** Fenster · 1 Flügel	1.010 × 1.260	985 × 1.235	**980 × 1.215**	RL IS	13
OG-03	 **Kind 2** Fenster · 2 Flügel	1.260 × 1.260	1.230 × 1.235	**1.230 × 1.215**	RS IS	14
OG-04	 **Bad** Fenster · 1 Flügel	905 × 1.040	880 × 1.010	**875 × 995**	IN	15
Dachgeschoss					2 Positionen · 2 Elemente	
DG-01	 **Studio** Fenster · 2 Flügel · Oberlicht kippbar	1.410 × 1.810	1.380 × 1.785	**1.380 × 1.765**	SC	16
DG-02	 **Ankleide** Fenster · 2 Flügel (Stulp)	1.010 × 1.210	985 × 1.185	**980 × 1.165**	KL	17

Bestellmaß: Ihr Abzug von der Maueröffnung (15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten bei Fenstern). Ring mit Ausrufezeichen: vor Ort prüfen, Hinweis bei der Position. Code aus Geschoss und Nummer; jede Zeile führt zur Seite der Position. Verbindlich bleibt Ihr Feinaufmaß.

MIT DEM KUNDEN ZU KLÄREN

0 von 15 geklärt

PFLICHT · 4

☐ Lüftung	**Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erforderlich: 13 von 16 Fenstern werden getauscht, mehr als ein Drittel.** Dichte neue Fenster: ohne Konzept drohen Feuchte und Schimmel.
☐ OG-02 Kind 1	**Absturzsicherung nötig (1. OG, Brüstung 780 mm): unteres Feld fest, Sicherheitsglas** Bauordnung (§ 38 MBO): Brüstung mindestens 80 cm, über 12 m Absturzhöhe 90 cm; Türen ohne Balkon davor immer.
☐ DG-01 Studio	**Absturzsicherung nötig (DG, Brüstung 450 mm): bitte beraten** Bauordnung (§ 38 MBO): Brüstung mindestens 80 cm, über 12 m Absturzhöhe 90 cm; Türen ohne Balkon davor immer.
☐ DG-01, DG-02	**Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung.** Landesbauordnung (§ 35 MBO), wenn es keine zweite Treppe gibt.

MIT DEM KUNDEN · 3

☐ Förderung	BAFA-Zuschuss gewünscht: Energieeffizienz-Experte einbinden, Antrag vor Beginn, Vertrag nur mit Förderklausel. Uw-Zielwerte bei den Positionen. Ohne Antrag vor Beginn gibt es keinen Zuschuss.
☐ Nachricht	„Bitte vorher anrufen, unser Hund ist freundlich.“ Nachricht beim Absenden des Aufmaßes.
☐ KG-01 Hobbyraum	2-fach-Glas gewählt: Für die Förderung braucht es Uw höchstens 1,1 W/(m²K), das schafft praktisch nur 3-fach-Glas. Mit 2-fach-Glas gibt es keine Förderung.

VOR ORT PRÜFEN · 8

☐ EG-01 Wohnen links	Laut Foto: Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐ EG-02 Wohnen Terrasse	Barrierefreie Schwelle: Abdichtung und Entwässerung außen (Rinne) einplanen. Ohne Schwelle muss Wasser außen sicher ablaufen.
☐ EG-02, EG-04, OG-01, OG-03, DG-01	Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen. Smart Home und Motor braucht Strom am Fenster.

MIT DEM KUNDEN ZU KLÄREN, FORTSETZUNG

0 von 15 geklärt

VOR ORT PRÜFEN · 8

☐	EG-02 Wohnen Terrasse	Laut Foto: Terrasse aus Holz auf Stelzlagern: Anschluss an die Schwelle vor Ort abstimmen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	OG-01 Schlafen	Laut Foto: Heizkörper direkt unter dem Fenster: Fensterbank innen nicht tiefer als 20 cm. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	OG-03 Kind 2	Unterputzkasten im Bestand: Sturz öffnen, Platz, Statik und Anschluss an Putz und Dämmung vor Ort prüfen. Der Kasten liegt in der Wand und wird überputzt; beim Austausch ist das ein Eingriff in den Sturz.
☐	OG-04 Bad	Laut Foto: Fliesen an der Laibung werden beim Ausbau wahrscheinlich beschädigt. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	DG-01 Studio	Laut Foto: Oberlicht nur mit Leiter erreichbar: kippbar mit Stange planen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.

NACH GEWERK, MIT DEN POSITIONEN

Aufstellung.

Stück · Positionen

FENSTER UND TÜREN

Fenster, Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß	3	KG-01 EG-05 OG-04
Fenster, Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß	7	EG-01 EG-03 OG-01 OG-02 OG-03 DG-01 DG-02
Hebe-Schiebe-Tür, Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß	1	EG-02
Balkontür, Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß	1	EG-04
Festverglasung, Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß	1	EG-06

SONNENSCHUTZ AUßEN

Rollladen 4 · Raffstore 3 · Screen 1 · Klappläden 1

Rollladen, Aufsatzkasten, elektrisch, anthrazit	2	EG-03 EG-04
Rollladen, Vorbaukasten, Smart Home, anthrazit	1	OG-01
Rollladen, Aufsatzkasten, Solar (ohne Stromanschluss), anthrazit	1	OG-02
Raffstore, Vorbaukasten, Smart Home, anthrazit	2	EG-01 EG-02
Raffstore, Unterputzkasten, elektrisch, anthrazit	1	OG-03
Screen, Vorbaukasten, elektrisch, anthrazit	1	DG-01
Klappläden	1	DG-02

SICHT- UND BLENDSCHUTZ INNEN

Plissee, grau	1	OG-01
Rollo, weiß	1	OG-04

INSEKTENSCHUTZ

Spannrahmen	5	KG-01 EG-01 OG-01 OG-02 OG-03
Schiebeanlage	1	EG-02
Drehrahmen	1	EG-03
Pendeltür	1	EG-04

GLAS

2-fach-Verglasung	1	KG-01
3-fach-Verglasung	12	EG-01 EG-02 EG-03 EG-04 EG-05 EG-06 OG-01 OG-02 OG-03 OG-04 DG-01 DG-02
Schallschutz	2	EG-01 OG-01
Sicherheitsglas	2	EG-02 EG-06
Sichtschutz (Satinato)	1	EG-05
Sichtschutz (Mastercarré)	1	EG-06
Sichtschutz (Chinchilla)	1	OG-04

SICHERHEIT

Einbruchschutz RC2	2	KG-01 EG-01
Absturzsicherung: unteres Feld fest, Sicherheitsglas	1	OG-02

STROM UND ANTRIEB

Strom am Fenster laut Foto vorhanden	2	EG-01 EG-03
Strom für den Antrieb klären, gegebenenfalls Elektriker	5	EG-02 EG-04 OG-01 OG-03 DG-01
Solarantrieb, ohne Stromanschluss	1	OG-02

MONTAGE

Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen	13	KG-01 EG-01 EG-02 EG-03 EG-04 EG-05 EG-06 OG-01 OG-02 OG-03 OG-04 DG-01 DG-02

KG-01

KELLER · POSITION 1 VON 1

Hobbyraum

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück · 1 Foto

BESTELLMAß-VORSCHLAG


780 × 565 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Insektenschutz Spannrahmen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

2-fach-Glas gewählt: Für die Förderung braucht es Uw höchstens 1,1 W/(m²K), das schafft praktisch nur 3-fach-Glas.

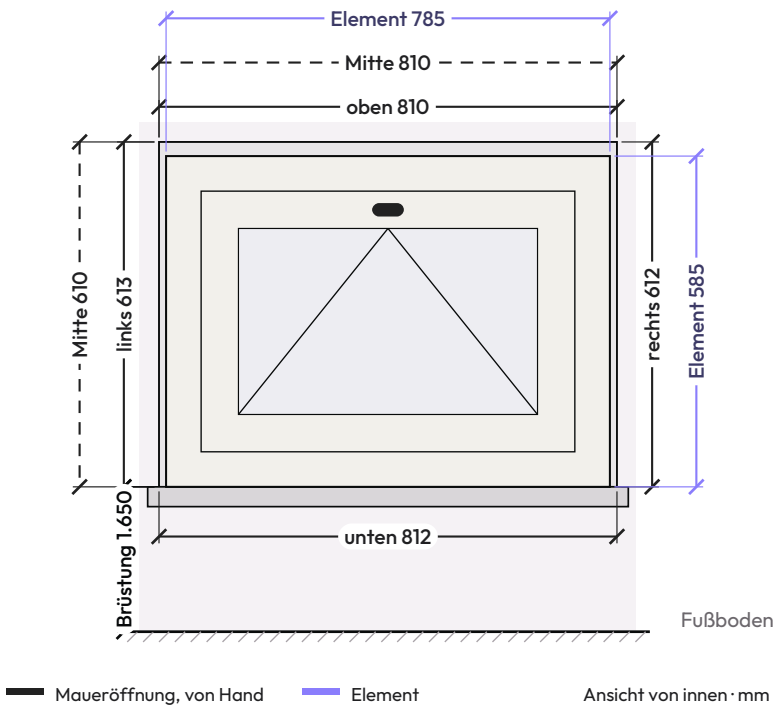

MAßE VON HAND

Maueröffnung	810 × 610 mm, kleinstes
Breiten	oben 810 · Mitte 810 · unten 812
Höhen	links 613 · Mitte 610 · rechts 612
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	785 × 585 mm mit Rahmen
Brüstung	1.650 mm
Laibung innen	300 mm
Lage	Keller
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 2-fach, 1 Flügel, Insektenschutz, RC2.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Kipp
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	2-fach
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (einbruchhemmend, RC2)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	RC2

SONNENSCHUTZ

außen	keiner
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 1 FOTO)

Auf einen Blick	**Kellerfenster mit Lichtschacht**
Laibung	tiefe Laibung, Lichtschacht außen

EG-01

ERDGESCHOSS · POSITION 1 VON 6

Wohnen links

Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMAß-VORSCHLAG

1.980 × 1.365 mm


Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Raffstore, Vorbaukasten, Smart Home

Insektenschutz Spannrahmen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

Laut Foto: Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen.

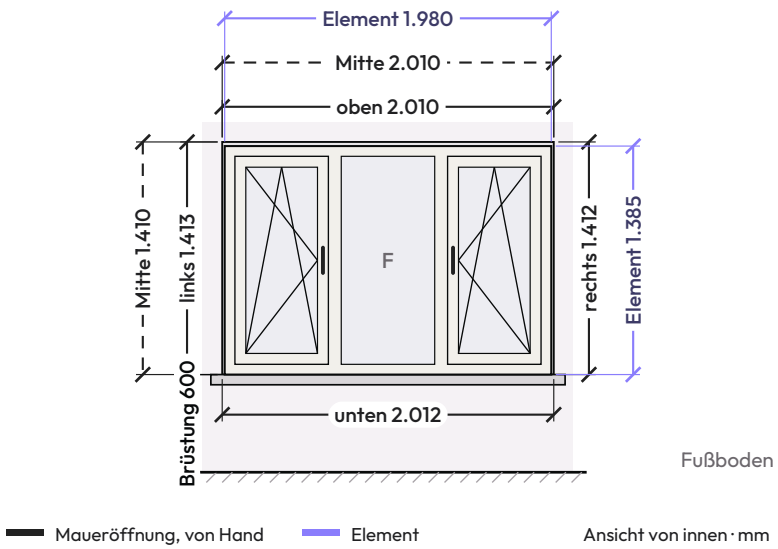

MAßE VON HAND

Maueröffnung	2.010 × 1.410 mm, kleinstes
Breiten	oben 2.010 · Mitte 2.010 · unten 2.012
Höhen	links 1.413 · Mitte 1.410 · rechts 1.412
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	1.980 × 1.385 mm mit Rahmen
Brüstung	600 mm
Laibung innen	150 mm
Lage	EG, Wand 365 mm
Einbau	Austausch

Vor Ort prüfen: Anschlag innen laut Foto; der Vorschlag ist ohne Anschlag gerechnet.

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach mit Schallschutz, 2 Flügel und 1 Festfeld, Raffstore elektrisch, Insektenschutz, RC2.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Fest · Dreh-Kipp DIN rechts
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Extras	Schallschutz
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (einbruchhemmend, RC2)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	RC2

SONNENSCHUTZ

außen	Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Kasten: Einbaukasten innen im Sturz · Anschlag innen · Fassade Putz · Strom am Fenster**
Rollladen	Einbaukasten innen im Sturz, Gurt links
Anschlag	Innenanschlag, Blendrahmen etwa 2 cm hinter der Innenkante
Fassade	Putz auf Mauerwerk
Vor Ort prüfen	Sturzhöhe für den Raffstore-Kasten
Hinweis	Für den Raffstore-Kasten die Sturzhöhe vor Ort prüfen.

EG-02

ERDGESCHOSS · POSITION 2 VON 6

Wohnen Terrasse

Hebe-Schiebe-Tür · 1 Stück · 2 Fotos


BESTELLMAß-VORSCHLAG
2.990 × 2.245 mm
Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben

Raffstore, Vorbaukasten, Smart Home

Insektenschutz Schiebeanlage

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 3

- Barrierefreie Schwelle: Abdichtung und Entwässerung außen (Rinne) einplanen.
- Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen.
- Laut Foto: Terrasse aus Holz auf Stelzlagern: Anschluss an die Schwelle vor Ort abstimmen.

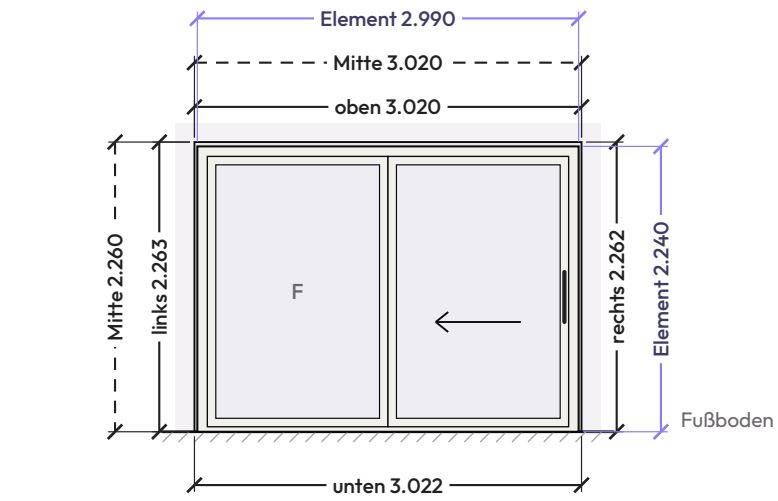

MAßE VON HAND

Maueröffnung	3.020 × 2.260 mm, kleinstes
Breiten	oben 3.020 · Mitte 3.020 · unten 3.022
Höhen	links 2.263 · Mitte 2.260 · rechts 2.262
Außer Winkel	unter 5 mm
Türelement	2.990 × 2.240 mm mit Rahmen
Brüstung	bodentief
Laibung innen	150 mm
Lage	EG, Wand 365 mm
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, Hebe-Schiebe-Tür, Raffstore elektrisch, Insektenschutz.

FENSTER

Element	Hebe-Schiebe-Tür
Öffnung	Schema A (1 Schiebeflügel vor 1 Festteil), Schiebeflügel rechts, barrierefrei ohne Schwelle (DIN 18040)
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Extras	Sicherheitsglas
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (barrierearme Schwelle)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Hebegriff, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Schiebeanlage

SCHWELLE UND BODEN

Schwelle	barrierefrei ohne Schwelle (DIN 18040)

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Terrassentür mit Seitenteil, ebenerdige Terrasse**
Boden	Fliesen innen, Terrasse auf gleicher Höhe
Vor Ort prüfen	Entwässerung der Schwelle
Hinweis	Terrasse aus Holz auf Stelzlagern: Anschluss an die Schwelle vor Ort abstimmen.

EG-03

ERDGESCHOSS · POSITION 3 VON 6

Küche

Fenster · 2 Flügel · 1 Stück · 2 Fotos


BESTELLMAß-VORSCHLAG

1.230 × 1.165 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Rollladen, Aufsatzkasten, elektrisch

Insektenschutz Drehrahmen

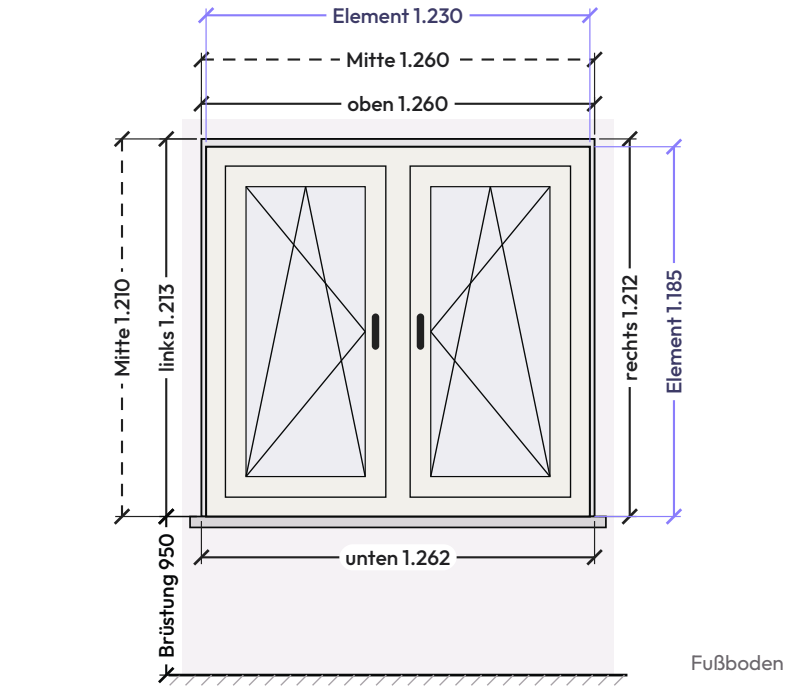

MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.260 × 1.210 mm, kleinstes
Breiten	oben 1.260 · Mitte 1.260 · unten 1.262
Höhen	links 1.213 · Mitte 1.210 · rechts 1.212
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	1.230 × 1.185 mm mit Rahmen
Brüstung	950 mm
Laibung innen	140 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, elektrisch
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Drehrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Strom am Fenster**
Fensterbank innen	Arbeitsplatte reicht bis an den Rahmen
Strom	Steckdose in der Nähe

EG-04

ERDGESCHOSS · POSITION 4 VON 6

Essen


Balkontür · 1 Flügel · 1 Stück · 1 Foto

BESTELLMAß-VORSCHLAG
880 × 2.175 mm
Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben

Rollladen, Aufsatzkasten, elektrisch | Insektenschutz Pendeltür

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen.

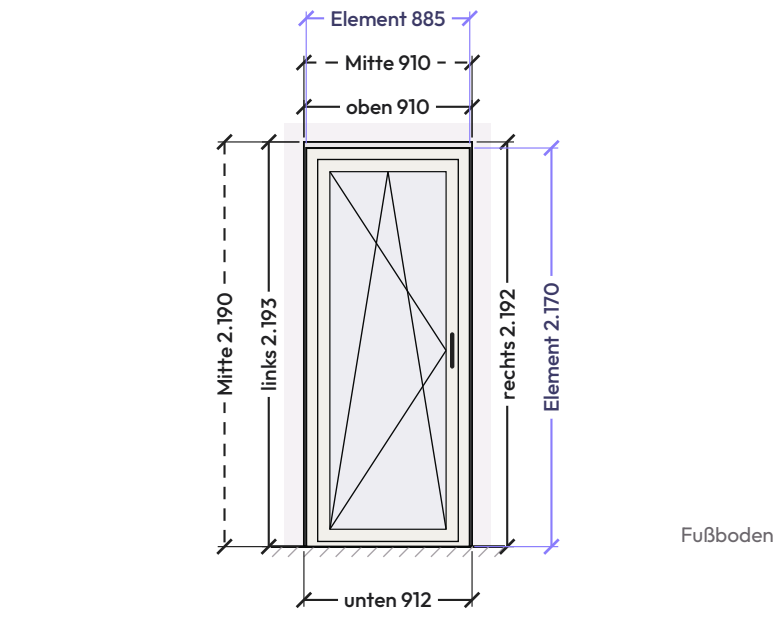

MAßE VON HAND

Maueröffnung	910 × 2.190 mm, kleinstes
Breiten	oben 910 · Mitte 910 · unten 912
Höhen	links 2.193 · Mitte 2.190 · rechts 2.192
Außer Winkel	unter 5 mm
Türelement	885 × 2.170 mm mit Rahmen
Brüstung	bodentief
Laibung innen	140 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch

Vor Ort prüfen: Anschlag innen laut Foto; der Vorschlag ist ohne Anschlag gerechnet.

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, Balkontür, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

FENSTER

Element	Balkon- oder Terrassentür
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links, flache Schwelle (ca. 20 mm)
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (barrierearme Schwelle)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Griff außen	Ziehgriff mit Schnäpper
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, elektrisch
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Pendeltür

SCHWELLE UND BODEN

Schwelle	flache Schwelle (ca. 20 mm)
Fußboden	Fußboden bleibt, wie er ist

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 1 FOTO)

Auf einen Blick	**Anschlag innen**
Auf einen Blick	**Balkontür mit Rollladenkasten innen**
Boden	Parkett innen, Balkon eine Stufe tiefer
Anschlag	Innenanschlag

EG-05

ERDGESCHOSS · POSITION 5 VON 6


Gäste-WC

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück · 1 Foto

BESTELLMAß-VORSCHLAG

585 × 770 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

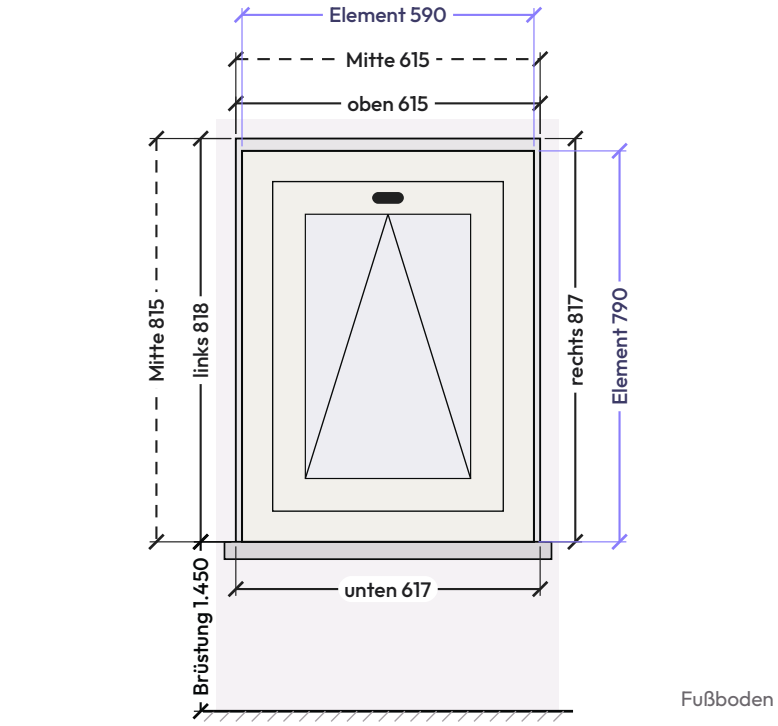

MAßE VON HAND

Maueröffnung	615 × 815 mm, kleinstes
Breiten	oben 615 · Mitte 615 · unten 617
Höhen	links 818 · Mitte 815 · rechts 817
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	590 × 790 mm mit Rahmen
Brüstung	1.450 mm
Laibung innen	120 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Kipp
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Extras	Sichtschutz (Satinato)
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	keiner
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	keiner

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 1 FOTO)

Auf einen Blick	**Kleines Kippfenster, Ornamentglas**
Laibung	Gefliest bis zur Hälfte

EG-06

ERDGESCHOSS · POSITION 6 VON 6


Flur neben der Haustür

Festverglasung · 2 Felder, fest verglast · 1 Stück · 1 Foto

BESTELLMAß-VORSCHLAG

390 × 2.075 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

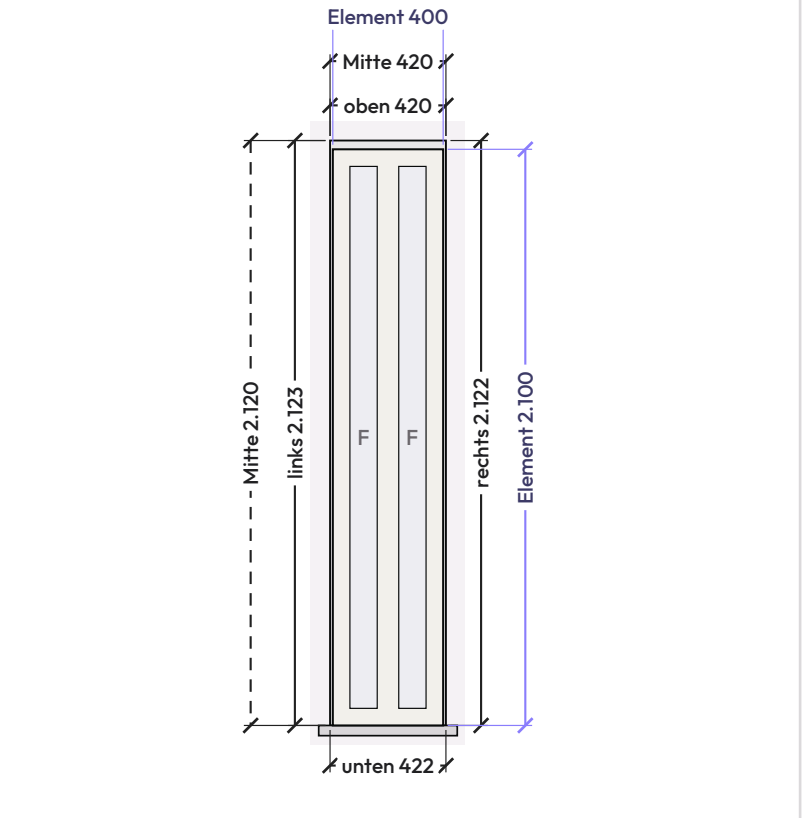

MAßE VON HAND

Maueröffnung	420 × 2.120 mm, kleinstes
Breiten	oben 420 · Mitte 420 · unten 422
Höhen	links 2.123 · Mitte 2.120 · rechts 2.122
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	400 × 2.100 mm mit Rahmen
Brüstung	–
Laibung innen	130 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, fest verglast.

FENSTER

Element	Festverglasung
Öffnung	2 Felder, fest verglast, ohne Griff
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Extras	Sicherheitsglas, Sichtschutz (Mastercarré)
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	ohne Griff
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	keiner
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	keiner

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 1 FOTO)

Auf einen Blick	**Schmales festes Seitenfenster neben der Haustür**
Fassade	Putz auf Mauerwerk

OG-01

1. OBERGESCHOSS · POSITION 1 VON 4

Schlafen


Fenster · 2 Flügel · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMAß-VORSCHLAG
1.480 × 1.215 mm
Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Rollladen, Vorbaukasten, Smart Home | Plissee innen | Insektenschutz Spannrahmen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 2

- Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen.
- Laut Foto: Heizkörper direkt unter dem Fenster: Fensterbank innen nicht tiefer als 20 cm.

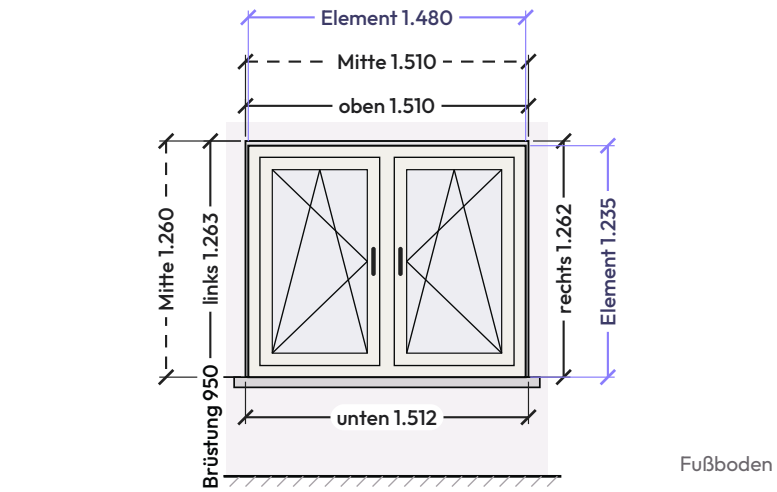

MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.510 × 1.260 mm, kleinstes
Breiten	oben 1.510 · Mitte 1.510 · unten 1.512
Höhen	links 1.263 · Mitte 1.260 · rechts 1.262
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	1.480 × 1.235 mm mit Rahmen
Brüstung	950 mm
Laibung innen	140 mm
Lage	1. OG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach mit Schallschutz, 2 Flügel, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Extras	Schallschutz
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (Schallschutzglas ab Rw 40 dB)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	Rollladen, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home
innen	Plissee, grau

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Zweiflügliges Fenster, Rollladenkasten innen**
Rollladen	Einbaukasten innen, Gurt rechts
Strom	keine Steckdose in der Nähe
Hinweis	Heizkörper direkt unter dem Fenster: Fensterbank innen nicht tiefer als 20 cm.

OG-02

1. OBERGESCHOSS · POSITION 2 VON 4

Kind 1

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMAß-VORSCHLAG


980 × 1.215 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Rollladen, Aufsatzkasten, Solar (ohne Stromanschluss) | Insektenschutz Spannrahmen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

⚠ **Absturzsicherung nötig (1. OG, Brüstung 780 mm): unteres Feld fest, Sicherheitsglas**

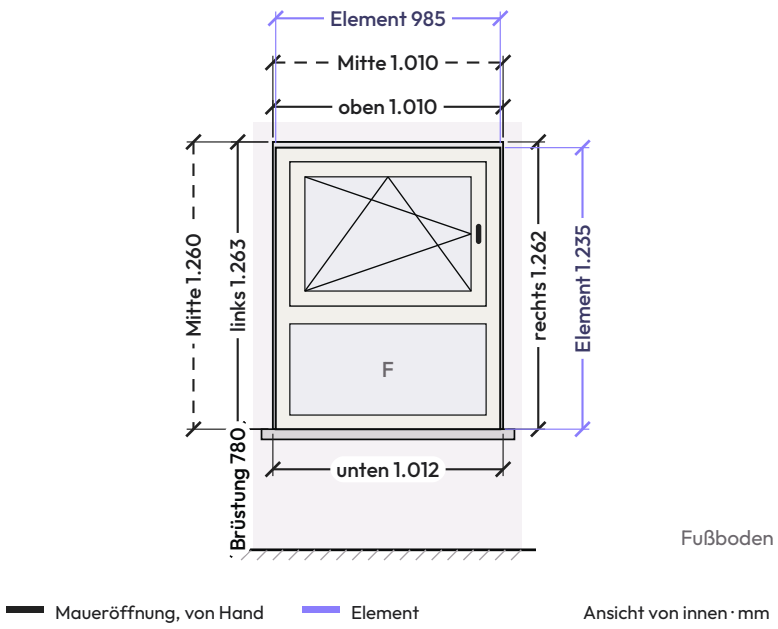

MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.010 × 1.260 mm, kleinstes
Breiten	oben 1.010 · Mitte 1.010 · unten 1.012
Höhen	links 1.263 · Mitte 1.260 · rechts 1.262
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	985 × 1.235 mm mit Rahmen
Brüstung	780 mm
Laibung innen	140 mm
Lage	1. OG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel, Rollladen mit Solarantrieb, Insektenschutz.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Unterlicht aus Glas, fest 400 mm
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz
Absturzsicherung	unteres Feld fest, Sicherheitsglas

SONNENSCHUTZ

außen	Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, Solar (ohne Stromanschluss)
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Einflügliges Fenster, niedrige Brüstung**
Fassade	Putz, Südseite

OG-03

1. OBERGESCHOSS · POSITION 3 VON 4

Kind 2

Fenster · 2 Flügel · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMAß-VORSCHLAG

1.230 × 1.215 mm


Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Raffstore, Unterputzkasten, elektrisch

Insektenschutz Spannrahmen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 2

- Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen.
- Unterputzkasten im Bestand: Sturz öffnen, Platz, Statik und Anschluss an Putz und Dämmung vor Ort prüfen.

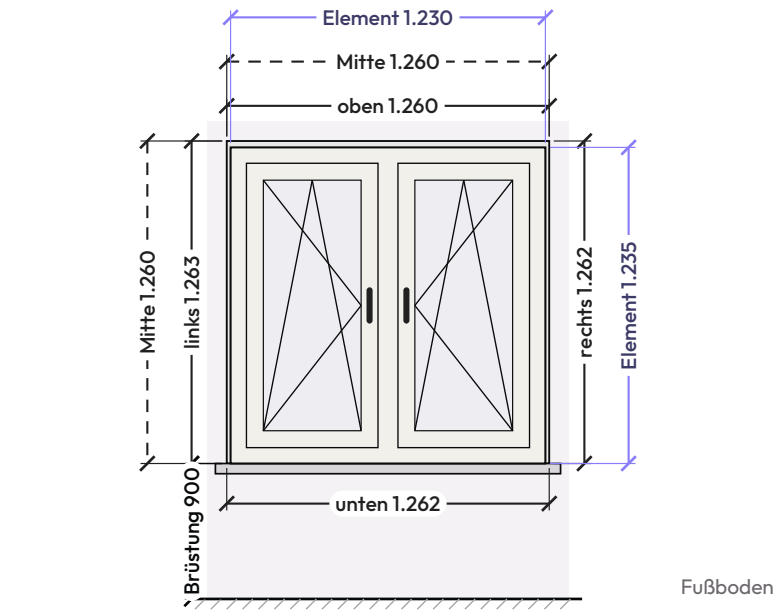

MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.260 × 1.260 mm, kleinstes
Breiten	oben 1.260 · Mitte 1.260 · unten 1.262
Höhen	links 1.263 · Mitte 1.260 · rechts 1.262
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	1.230 × 1.235 mm mit Rahmen
Brüstung	900 mm
Laibung innen	140 mm
Lage	1. OG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Raffstore elektrisch, Insektenschutz.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	Raffstore, Unterputzkasten (in der Wand, überputzt), anthrazit, elektrisch
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Zweiflügliges Fenster, alter Rollladenkasten innen**
Sturz	Betonsturz, verputzt

OG-04

1. OBERGESCHOSS · POSITION 4 VON 4

Bad

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück · 1 Foto

BESTELLMAß-VORSCHLAG


875 × 995 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Rollo innen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

Laut Foto: Fliesen an der Laibung werden beim Ausbau wahrscheinlich beschädigt.

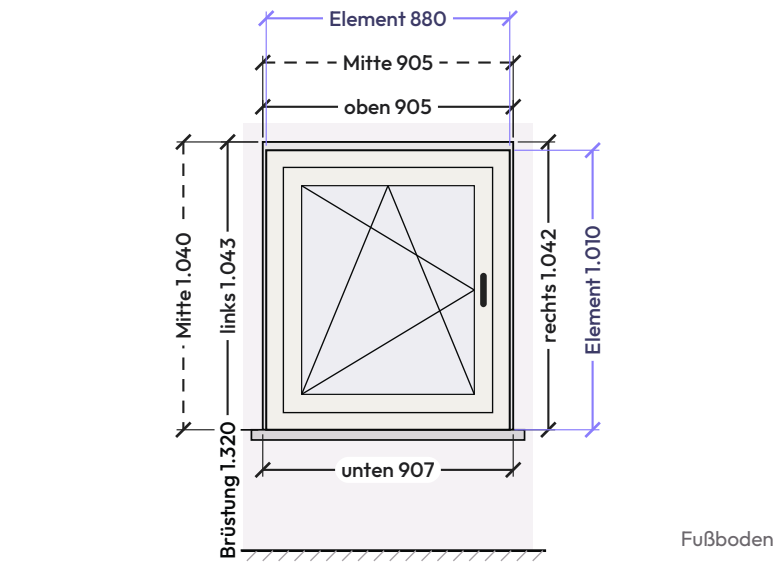

MAßE VON HAND

Maueröffnung	905 × 1.040 mm, kleinstes
Breiten	oben 905 · Mitte 905 · unten 907
Höhen	links 1.043 · Mitte 1.040 · rechts 1.042
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	880 × 1.010 mm mit Rahmen
Brüstung	1.320 mm
Laibung innen	120 mm
Lage	1. OG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh-Kipp DIN links
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Extras	Sichtschutz (Chinchilla)
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	keiner
innen	Rollo, weiß

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	keiner

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 1 FOTO)

Laibung	Gefliest bis an den Blendrahmen
Feuchte	Feuchteflecken in der unteren Laibungsecke

Vor Ort prüfen	Fliesen an der Laibung beim Ausbau
Hinweis	Fliesen an der Laibung werden beim Ausbau wahrscheinlich beschädigt.

DG-01

DACHGESCHOSS · POSITION 1 VON 2

Studio

Fenster · 2 Flügel · Oberlicht kippbar · 1 Stück · 2 Fotos

BESTELLMAß-VORSCHLAG


1.380 × 1.765 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Screen, Vorbaukasten, elektrisch

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 4

- **Absturzsicherung nötig (DG, Brüstung 450 mm): bitte beraten**
- **Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung.**
- Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen.
- Laut Foto: Oberlicht nur mit Leiter erreichbar: kippbar mit Stange planen.

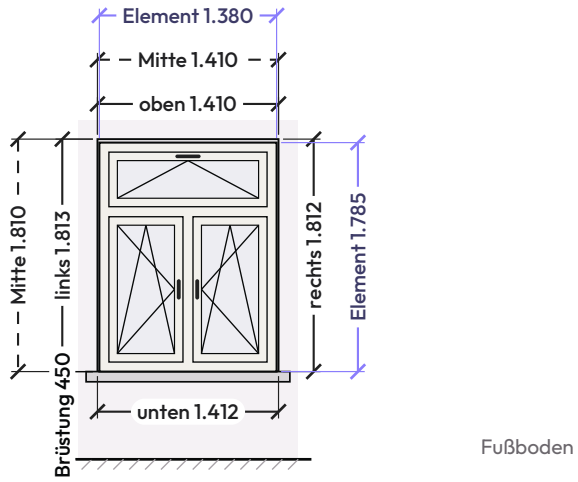

Maueröffnung, von Hand · Element · Ansicht von innen · mm

MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.410 × 1.810 mm, kleinstes
Breiten	oben 1.410 · Mitte 1.410 · unten 1.412
Höhen	links 1.813 · Mitte 1.810 · rechts 1.812
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	1.380 × 1.785 mm mit Rahmen
Brüstung	450 mm
Laibung innen	160 mm
Lage	DG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel mit Oberlicht, Screen elektrisch.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Oberlicht kippbar · Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz
Absturzsicherung	offen, bitte beraten

SONNENSCHUTZ

außen	Screen (Textil), Vorbaukasten, anthrazit, elektrisch
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	keiner

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 2 FOTOS)

Auf einen Blick	**Großes Fenster in der Giebelwand mit Oberlicht**
Fassade	Holzverschalung
Hinweis	Oberlicht nur mit Leiter erreichbar: kippbar mit Stange planen.

DG-02

DACHGESCHOSS · POSITION 2 VON 2

Ankleide

Fenster · 2 Flügel (Stulp) · 1 Stück · 1 Foto

BESTELLMAß-VORSCHLAG


980 × 1.165 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

Klappläden

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung.

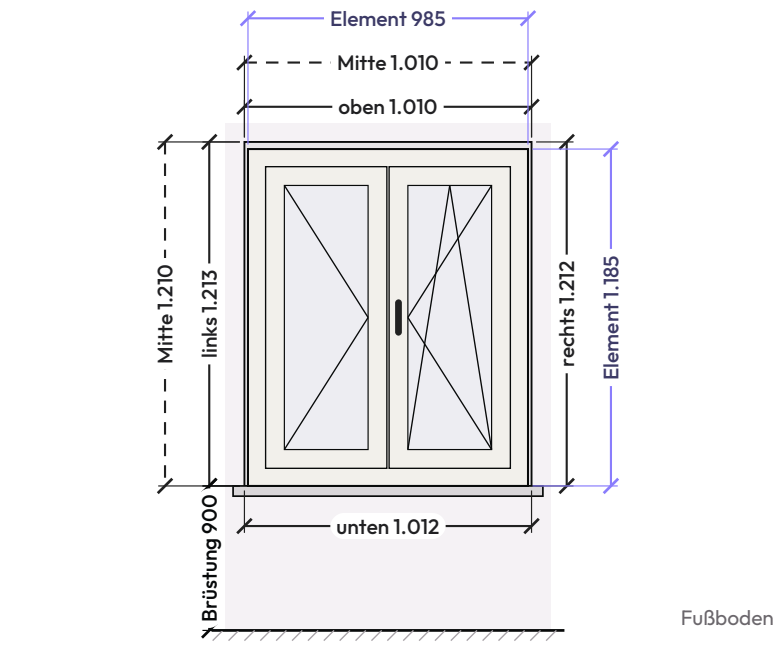

MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.010 × 1.210 mm, kleinstes
Breiten	oben 1.010 · Mitte 1.010 · unten 1.012
Höhen	links 1.213 · Mitte 1.210 · rechts 1.212
Außer Winkel	unter 5 mm
Element	985 × 1.185 mm mit Rahmen
Brüstung	900 mm
Laibung innen	160 mm
Lage	DG
Einbau	Austausch

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Klappläden.

FENSTER

Element	Fenster
Öffnung	Dreh DIN links (Standflügel) · Dreh-Kipp DIN rechts
Material	Kunststoff

FARBE

außen	Anthrazitgrau (RAL 7016)
innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	3-fach
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Standard, weiß
Einbruchschutz	Basisschutz

SONNENSCHUTZ

außen	Klappläden
innen	keiner

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	keiner

FENSTERBÄNKE

innen	behalten
außen	Aluminium

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EINBAUSITUATION AUS DEN FOTOS (KI, 1 FOTO)

Auf einen Blick	**Stulpfenster, alte Klappläden aus Holz**


ZAHLEN ZUM PROJEKT

Positionen	13	Größtes Element	EG-02 Wohnen Terrasse, 2.990 × 2.240 mm
Elemente	13	Fotos	20, alle von der KI ausgewertet
Geschosse	Keller, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, Dachgeschoss	Maße	alle 8 Handmaße je Fenster
Fensterfläche	etwa 23,7 m² (Element, alle Stück)	Ihr Abzug	15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten (Fenster)


ALLE ELEMENTE IM SELBEN MAßSTAB



KG-01
Hobbyraum
785 × 585




EG-01
Wohnen links
1.980 × 1.385



EG-02
Wohnen Terrasse
2.990 × 2.240



EG-03
Küche
1.230 × 1.185



EG-04
Essen
885 × 2.170



EG-05
Gäste-WC
590 × 790



EG-06
Flur neben der Haustür
400 × 2.100



OG-01
Schlafen
1.480 × 1.235



OG-02
Kind 1
985 × 1.235



OG-03
Kind 2
1.230 × 1.235



OG-04
Bad
880 × 1.010



DG-01
Studio
1.380 × 1.785



DG-02
Ankleide
985 × 1.185
